




▲工事の様子（2024年7月19日）

今週はコンクリートポンプ車の注入音が続き、今日金曜日までに校舎左側は3階床部まで、右側は2階床部までのコンクリートが打ち込まれました。おおぜいの作業員の方により、さらに上層階へ向けて鉄筋が組まれています。暑い中毎日ご苦労さま。

現場からは以上です！





▲工事の様子（2024年7月13日）

4階近くまで足場が作られ、鉄筋の組み立てが進んでいます。東側鉄骨部分もコンクリート用の型ができてきました。



▲工事の様子（2024年6月19日）

新校舎東側の鉄骨部分はあっというまに4階まで組みあがりました。
（さらにワイドなレンズで撮影して3枚の写真をつないでいます。）



▲ 4階建ての中学・高校新校舎

2025年3月 新校舎完成予定

よりよい学習環境を目指して

2025年3月の完成を目指し、新校舎新築へ向けての工事がスタートしました。

新校舎はWiFiアクセスポイントが随所に設置され全教室がICT教育対応となるほか、イングリッシュサロンや多目的ホールが新設されます。さらに2、3階テラスにはグリーンを配置するなどSDGsを意識した設計となっています。

また、現在中学校校舎がある場所には、2026年3月に新しい食堂が完成する予定です。

リニューアルスケジュール


2023年8月	旧高校校舎解体
2024年1月	中高新校舎工事開始
2025年3月	中高新校舎完成
4月	新校舎での授業開始
	旧中学校校舎解体
9月	新食堂工事開始
2026年3月	新食堂完成
4月	新食堂使用開始



▲ ガラス張りの新食堂
(2026年3月完成予定)



▲北側（小畔川側）から見た新校舎。新校舎は中高合同で地上4階建てとなり、旧高校校舎より広い敷地に建設されます。

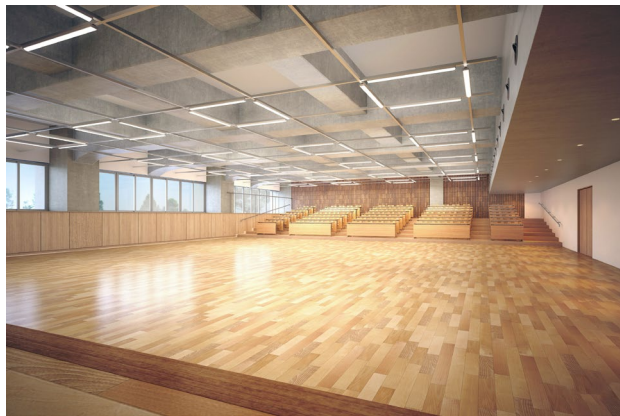

▲こちらは1階に建設されるホール。集会やイベントなどに使用される予定。



▲タブレットや電子黒板などに対応するため、全教室でWiFiアクセスが可能。



▲3階に設置される明るく清潔な自習室（右）と多目的ホール（左）。



▲4階のテラスに面して設置されるイングリッシュサロンは、英語教育に活用。

※すべて完成予想図であり、実際とは異なる場合があります。
